



TOP 3


Radwegebau auf der Bahntrasse zwischen Hückeswagen und Bergisch Born



Sitzung des Ausschusses für
Bauen und Verkehr

08.02.2011

Radweg auf der Bahntrasse - Bauabschnitte

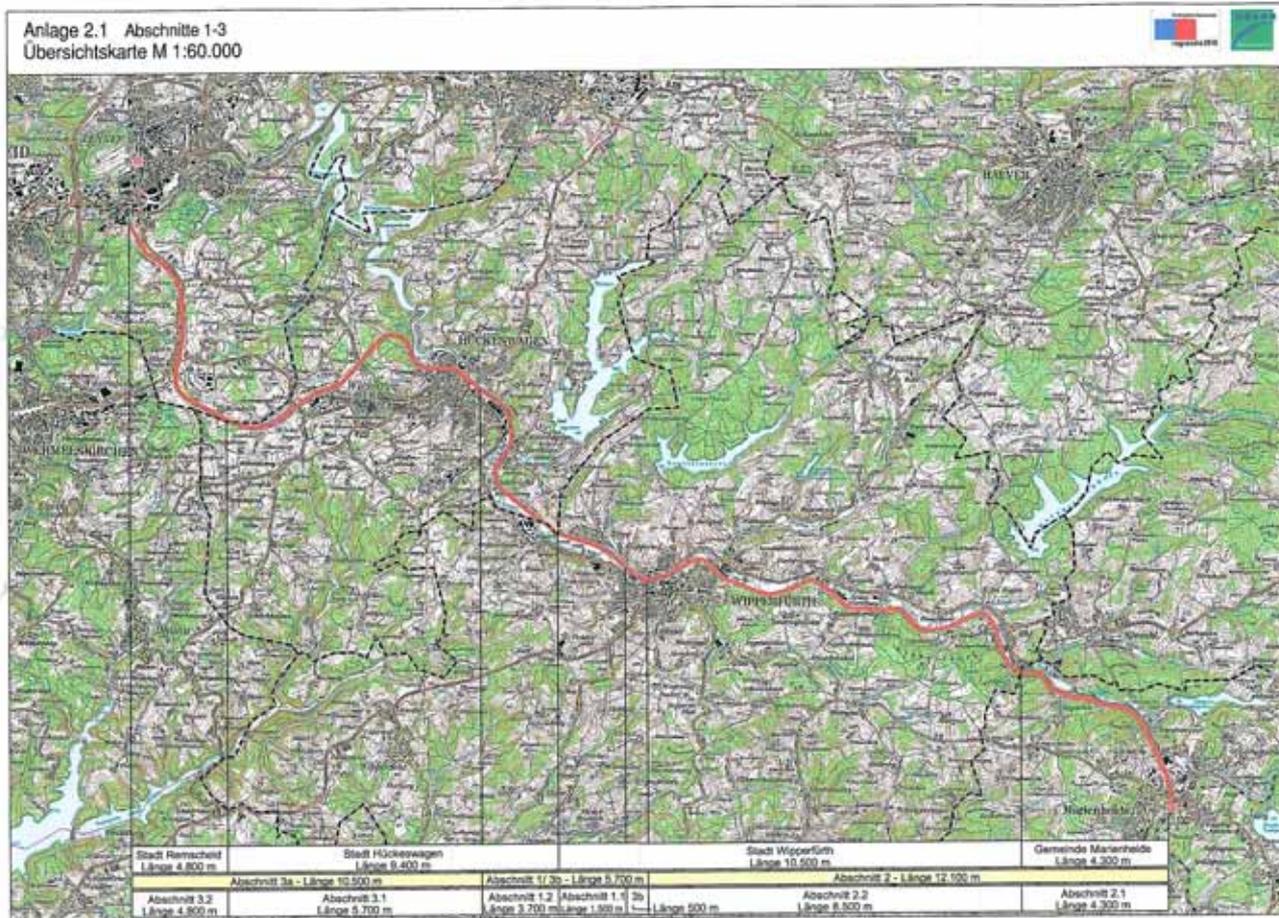

Abschnitt 3: 10 km

Abschnitt 2: 15 km

Abschnitt 1: 5 km


Sachstand



- Gleisrückbau ist teilweise erfolgt
- Bauwerkssanierung ist begonnen
- Ausschreibung für Asphaltarbeiten ist erfolgt – ungeprüftes Ergebnis liegt im Rahmen der Erwartungen



Höhsieper Tunnel

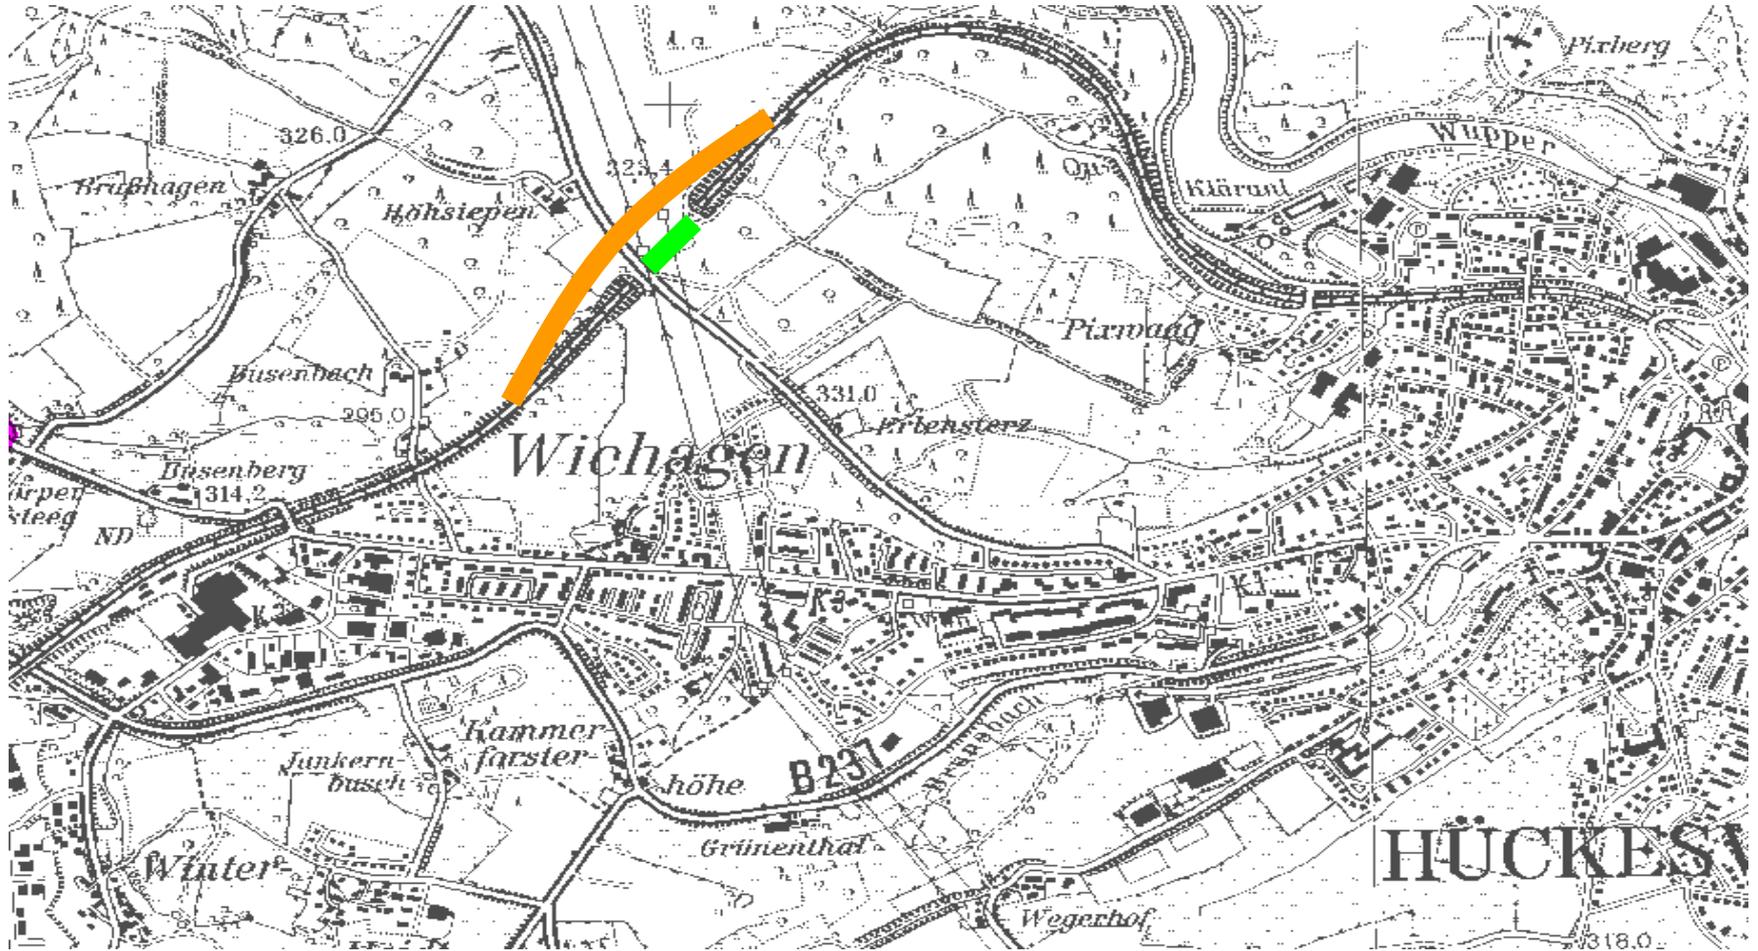

Fledermäuse



Vorgefundene Arten

- braune Langohren
- große Mausohren



Alle Arten sind streng geschützt nach Anhang 4 der FFH-Richtlinie

Fledermäuse



- Wasserfledermäuse
- Zwergfledermäuse
- Bartfledermäuse







Umgang mit Artenschutz



- Gutachten zu Fledermäusen ist in Arbeit
- Entscheidung ob ganzjährige Öffnung möglich ist, ist noch nicht getroffen
- Halbjährliche Öffnung ist unwirtschaftlich

- Haushaltseinplanung nach Zahlen von 2007 (Grundlage Pauschale Einschätzung der BEG): 2,67 Mio. €
- Schätzkosten nach Ingenieurplanung 2009: 3,25 Mio € incl. Grunderwerb einschl. 550 T € für Tunnelsanierung
- Aus Gesamtkostensteigerung Erhöhung des Eigenanteils um 135.000 €

