

Straßenbaumaßnahmen 2018

Ausblick 2019

Ausschuss für Bauen und Verkehr
14.02.2019

Baumaßnahmen 2018


- **Neubau**

- Carl-Benz-Straße
- Clarenbachstraße
- Hambüchener Weg

- **Sanierung**

- Hochstraße
- Winterhagen / Scheideweg

Carl-Benz- und Clarenbachstraße

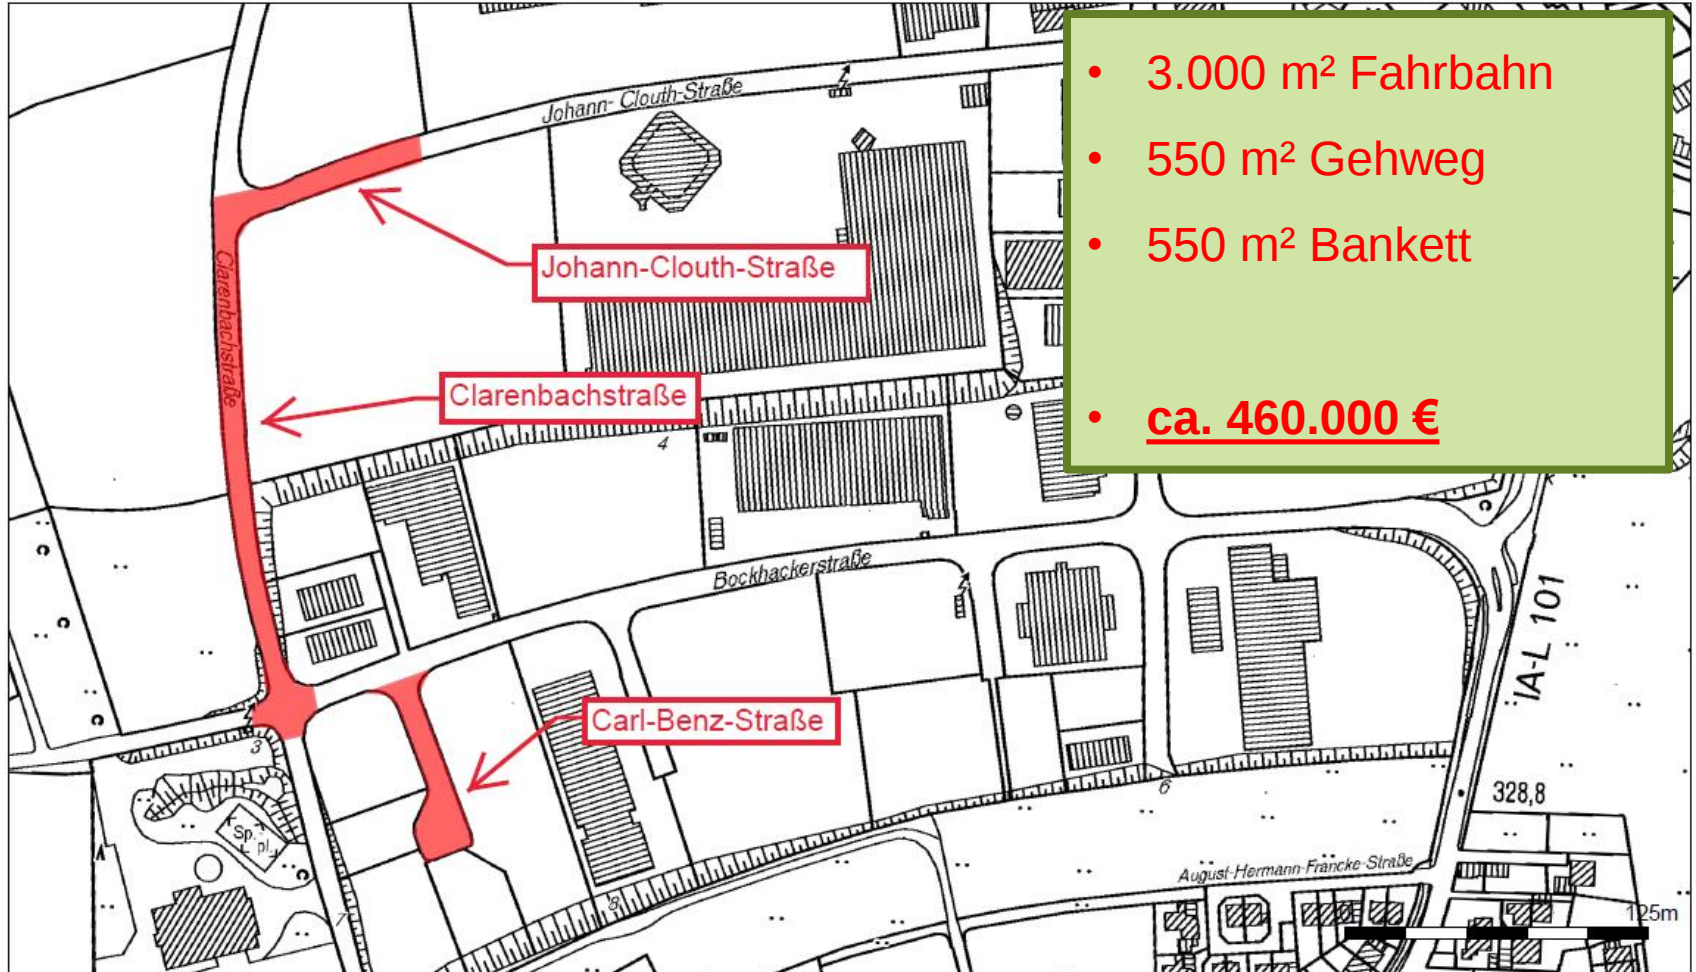


Carl-Benz- und Clarenbachstraße



Carl-Benz- und Clarenbachstraße



Hambüchener Weg

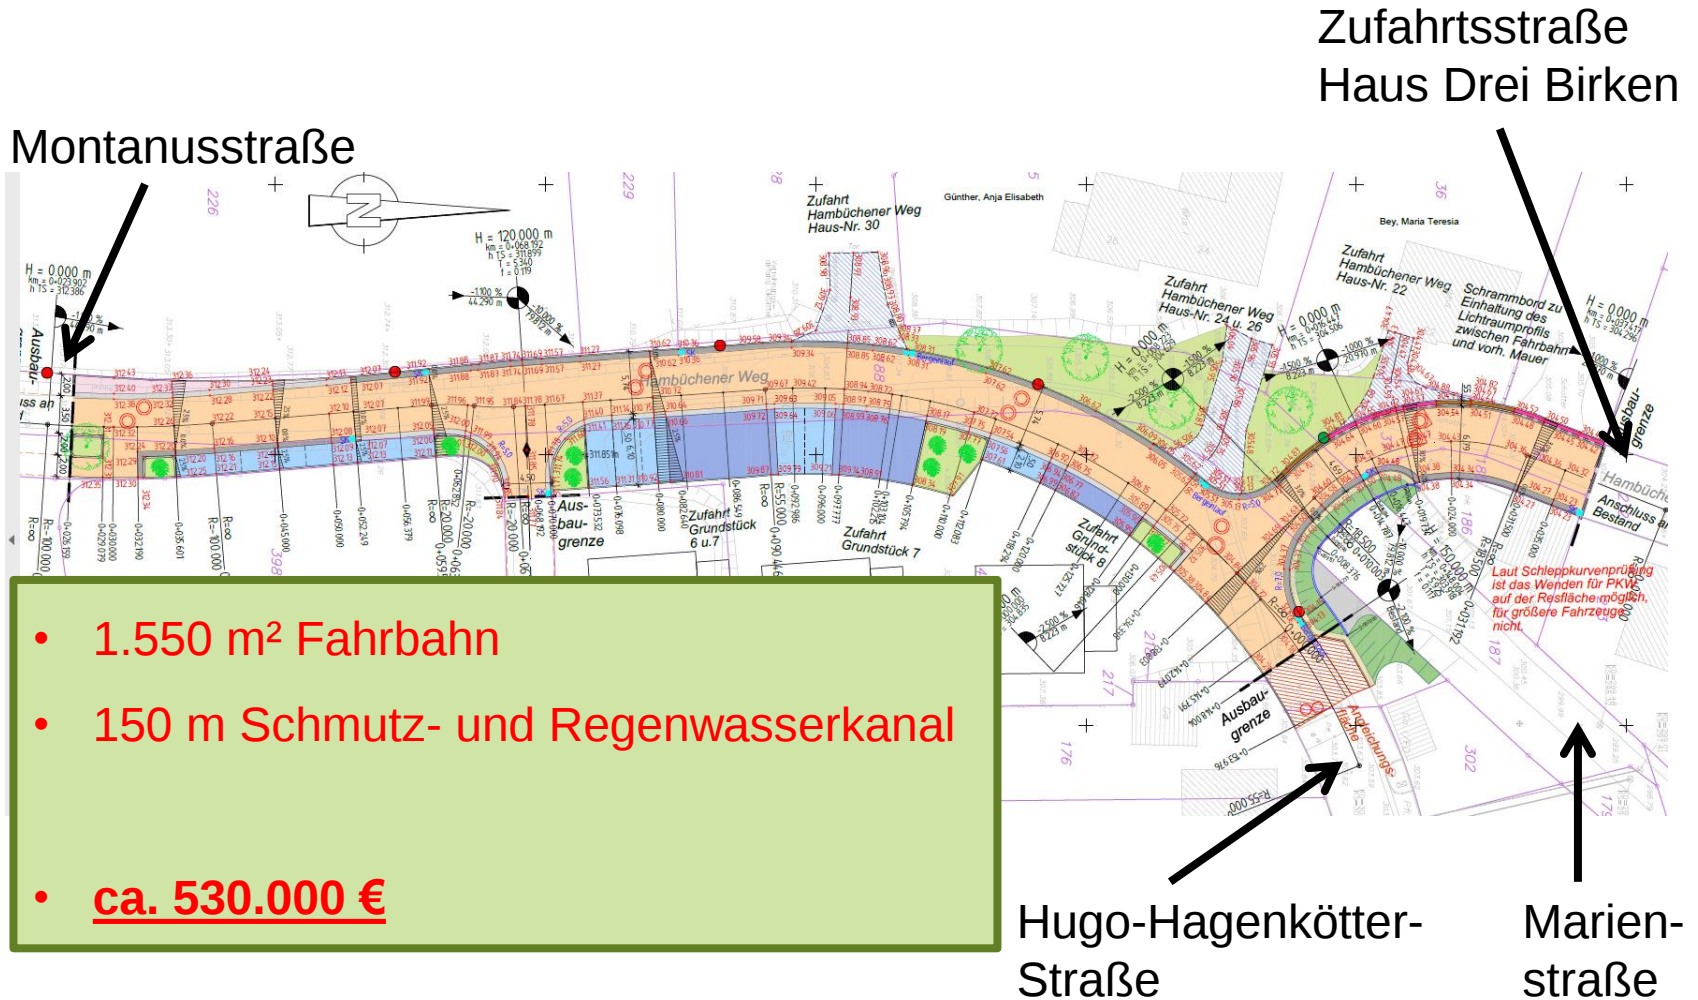

Hambüchener Weg



Hambüchener Weg



Neubaumaßnahmen

- **ca. 5.000 m² neue Verkehrsflächen**
- **ca. 150 m Schmutz- und Regenwasserkanal inkl. Schachtbauwerke und Sinkkästen**
- **13 neue Straßenlaternen**
- **ca. 990.000 € (inkl. Ingenieur- und Vermessungsleistungen)**

Straßensanierungen 2018

Straße	Gepl. Fläche [m²]	Tats. Fläche [m²]	Kosten [€]	Bemerkung
Hochstraße	1.300	1.800	120.000	Fa. Dohrmann
Winterhagen	950	1.700	90.000	Fa. Dohrmann
Straßenentwässerung Wegerhof			20.000	Fa. Dohrmann
Hangsicherung Marienstraße			38.000	Fa. Schulte
Gesamt	2.250	3.500	268.000	

Hochstraße

Zustand Befahrung 2012




Hochstraße




Winterhagen / Scheideweg

Zustand Befahrung 2012

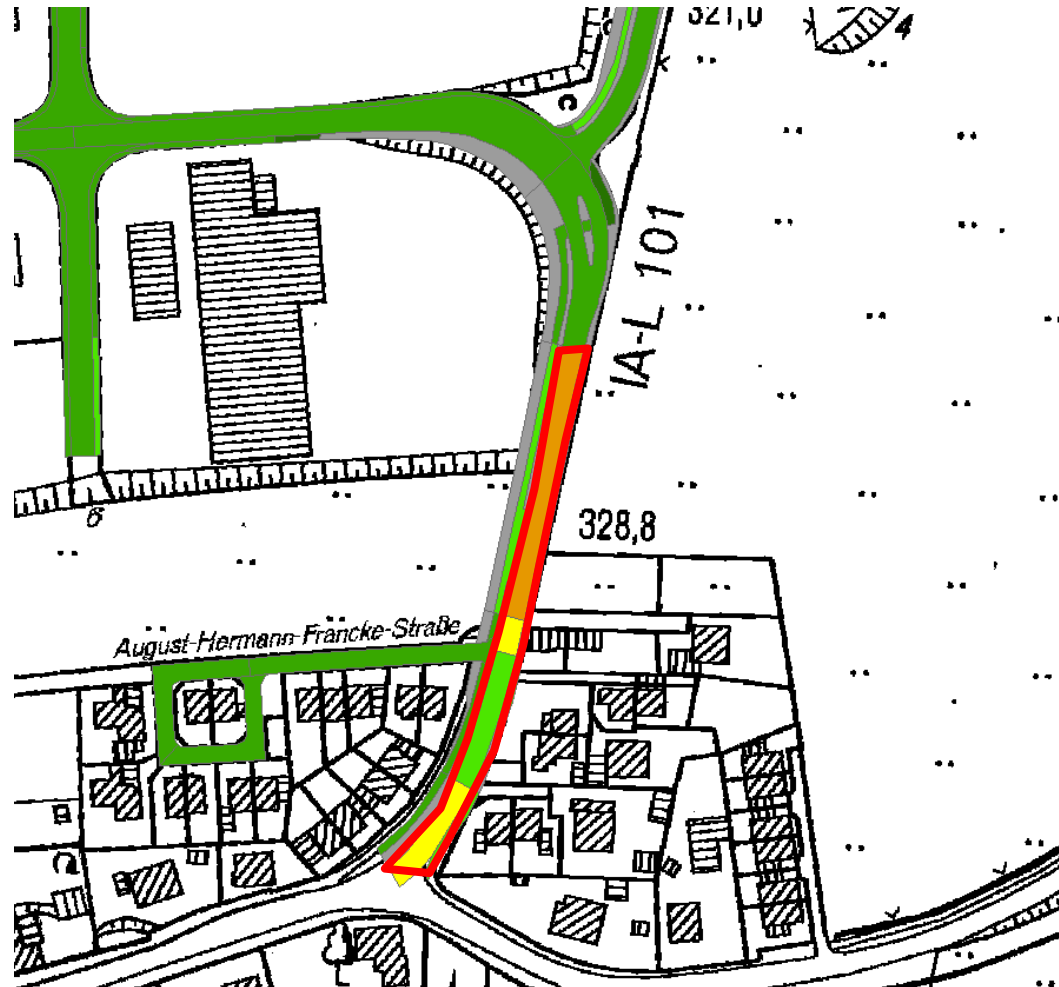

Winterhagen / Scheideweg

Zustand Befahrung 2012

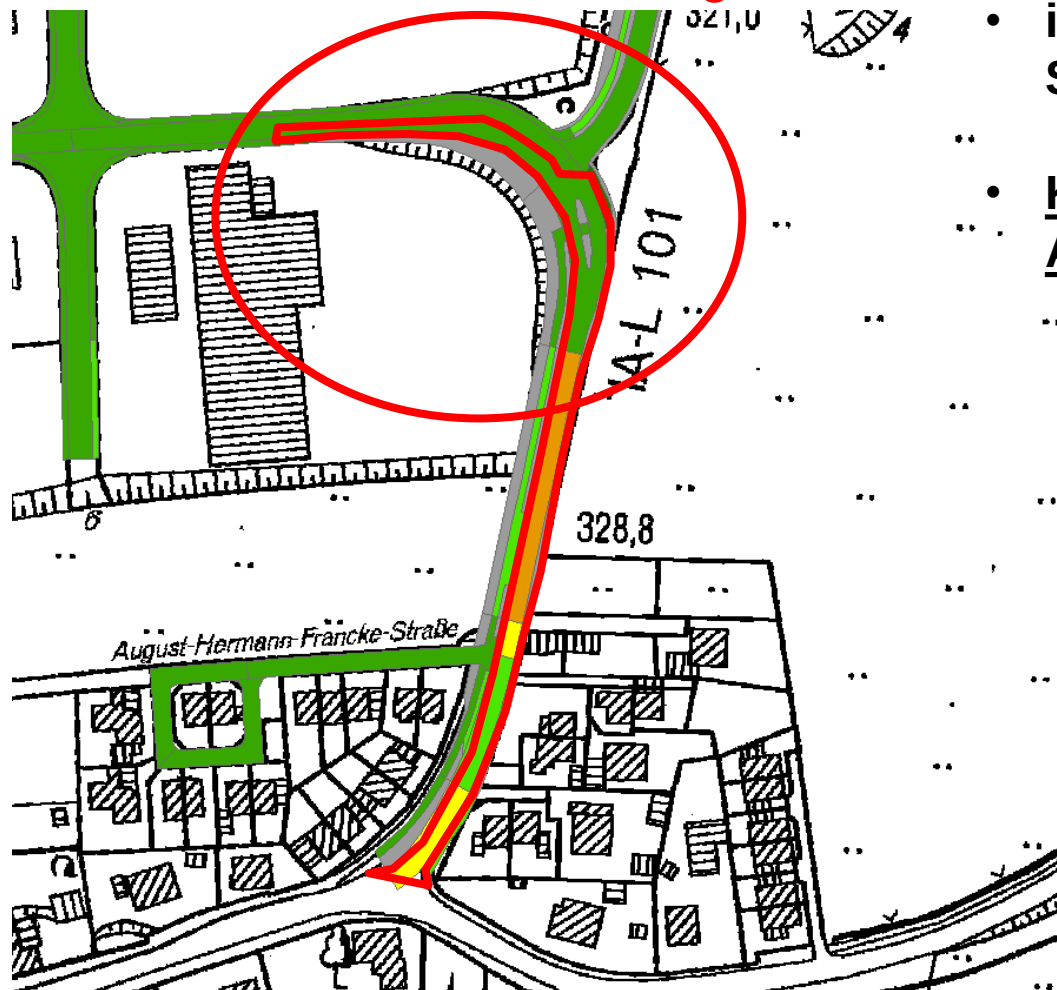

- in 2018 viele Risse und Schlaglöcher
- Keine Überschreitung der Auftragssumme!
- Kein teerhaltiges Material vorgefunden
- Kostenersparnis bei Entsorgung
- Fachunternehmen vor Ort

Winterhagen / Scheideweg



Straßenentwässerung Wegerhof



Hangsicherung Marienstraße




Sanierungsmaßnahmen


2019

Gardelenbergstraße

Zustand Befahrung 2012

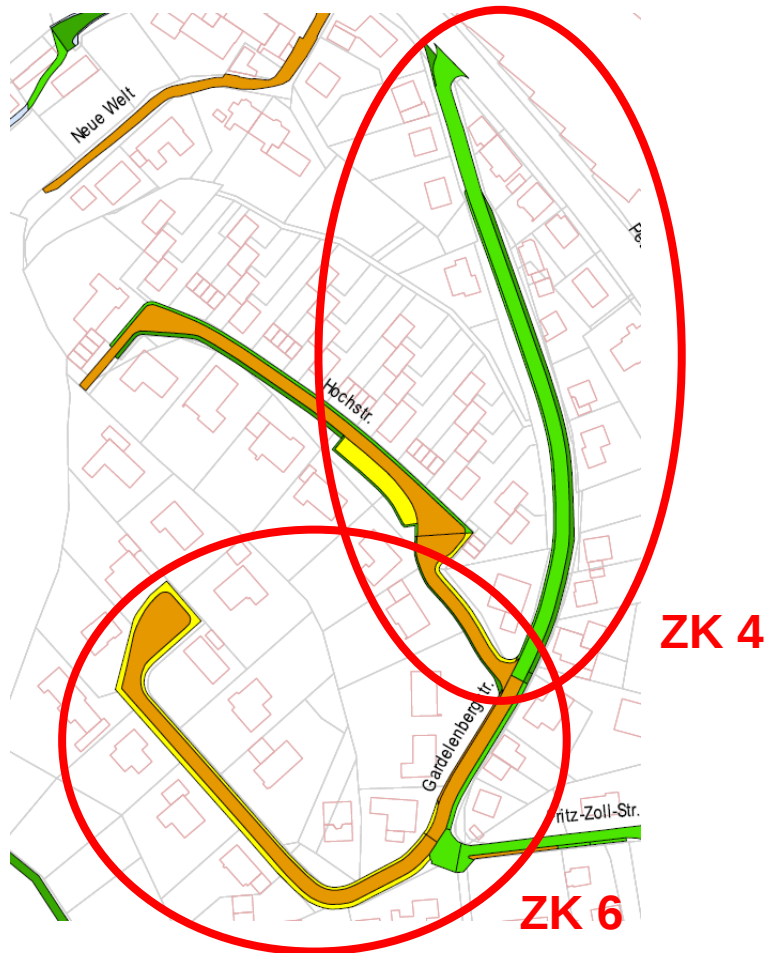

Zustand Befahrung 2018

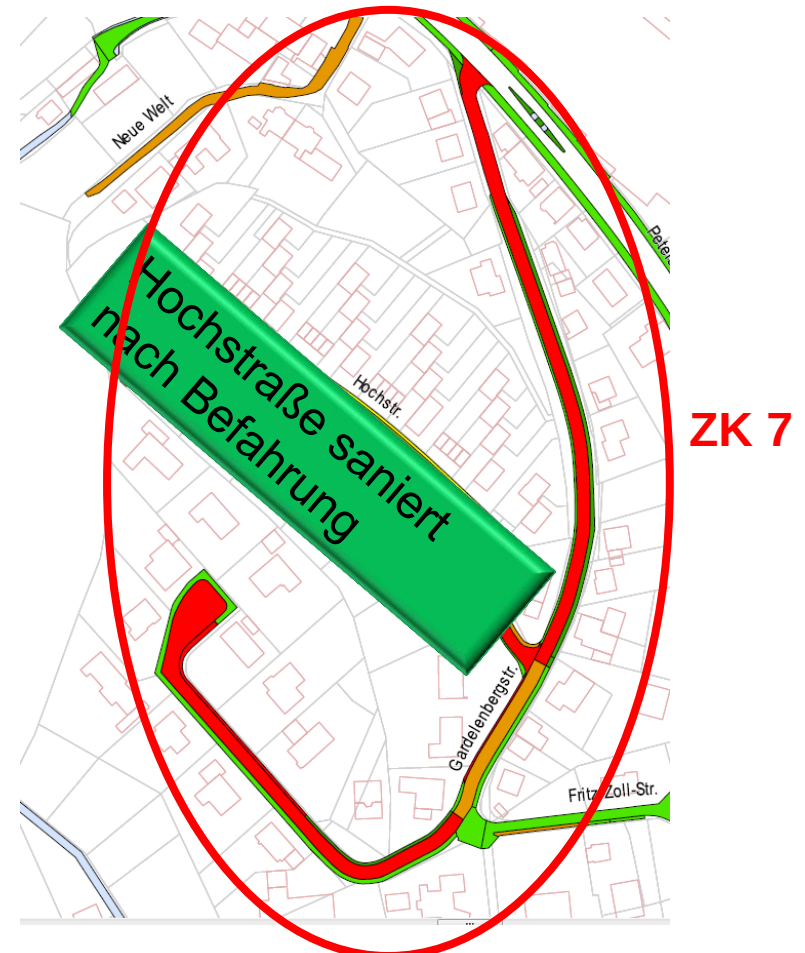


Gardelenbergstraße

- **Gründe?**
 - **Kein Schichtenverbund? (2 Bohrkerne aus 2016)**
 - **frostsicherer Aufbau nicht ausreichend?**
- **Weitere Entnahme von Bohrkernen sowie Rammkernsondierung notwendig!**

Rissesanierung Stadtstraße

Zustand Befahrung 2012

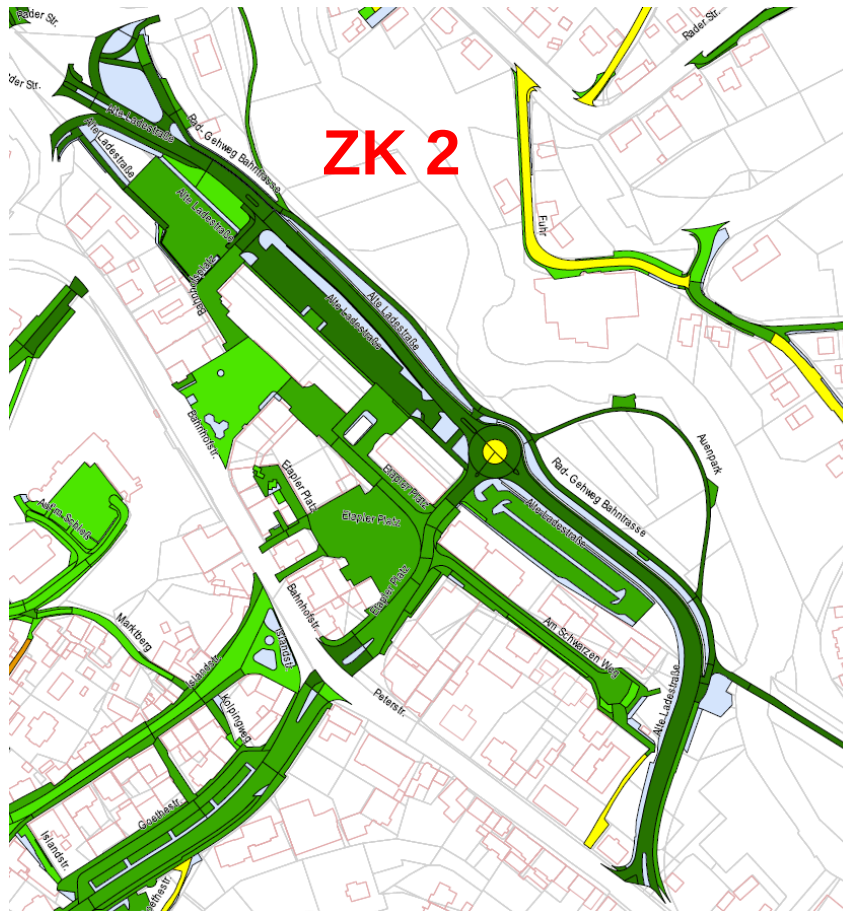

Zustand Befahrung 2018

